ELETTROQUADRI Bisuschio (VA) Tel. 0332/47.00.49	Cliente	Ordine nr. ..... Del ..... Riferimento	Data richiesta ..../..../....

Precablaggio Piattaforma

Disposizione vano

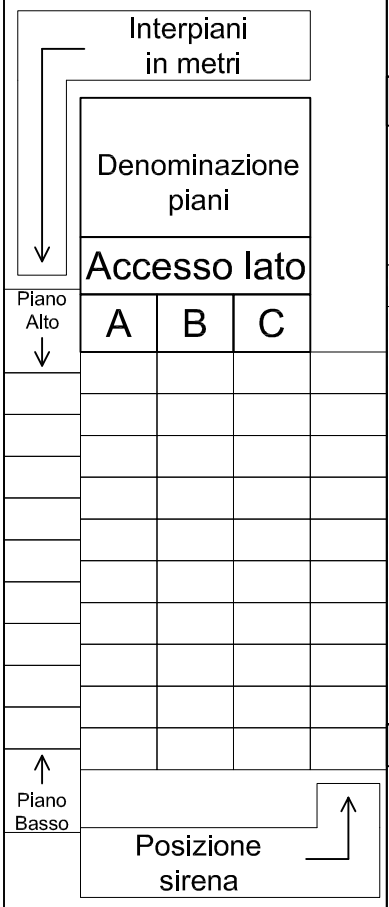

Legenda

► Obbligatorio

(?) Tra parentesi sono indicati i valori che saranno forniti salvo diversa precisazione

Note

Dati principali

► Posizione Q.M. ☐ Al piano più alto ☐ Al piano più basso ☐ Al piano .....

► Lunghezza percorso da Q.M. a 1° bottoniera (4) .....

Testata (3.5) .....
Fossa (0.5) .....
Piano Principale (0) .....

☐ Fune

Lunghezza percorso da Q.M. ad argano	(4)	.....
Cavo di potenza Schermato	(vedi Q.M. argano)	
Cavo per freno	(vedi Q.M. argano)	
Cavo per termistori	(vedi Q.M. argano)	
Posizione UPS	(in testata)	.....
Lunghezza percorso da Q.M. a UPS	(1.5)	.....
Posizione pesacarico ☐ Testata		.....
☐ Cabina (std.)	(4)	.....
Tensione alimentazione pesacarico	(24 Vcc)	.....
Cavo limitatore velocità in testata	(4)	.....
Cavo tenditore limitatore di velocità in fossa	(4)	.....
Extracorsa In cabina	(4)	.....

☐ Oleo

Lunghezza percorso da Q.M. a centralina	(2)	.....
Cavo alimentazione centralina	(vedi Q.M. centralina)	
Cavo termistori	(vedi Q.M. centralina)	
Cavo termocontatto	(vedi Q.M. centralina)	
Cavo pressostato	(vedi Q.M. centralina)	
Extracorsa nel vano	(3.5)	.....

Accessori

Kit primo Avvio		
Attrezzo per cablare i connettori		
Reggicavo a cuneo	(1)	.....
Staffe per fissaggio cavi piatti	(1)	.....

Precablaggio standard per cabina

Cavi piatti precablati	(Dist. Q.M. 1° bot. + Corsa + 4)	.....
Concentratore cavi piatti ☐ Tetto cabina (L150-H500-P80)		
☐ Dietro la bottoniera di cabina		
☐ Altro		.....
Cavo bottoniera di cabina	(2.5)	.....
Schede chiamate e display in bottoniera cabina (solo seriale)		

Contatti magnetici "Reed" con staffe	(1)	.....
Cavo illuminazione cabina	(4)	.....
Cavo apparecchio sicurezza	(4)	.....
Cavo operatore porte e/o contatto porte ☐ Accesso A	(1.5)	.....
☐ Accesso B	(1.5)	.....
☐ Accesso C	(1.5)	.....

Precablaggio standard per vano

Matassa vano con derivazioni chiamate, segnalazioni e sicurezze

Cavo bottoniera ☐ Accesso A	(1.5)	.....
☐ Accesso B	(3.5)	.....
☐ Accesso C	(3.5)	.....
Cavo serrature ☐ Accesso A	(3.5)	.....
☐ Accesso B	(5.5)	.....
☐ Accesso C	(5.5)	.....
Semaforo fossa ☐ Predisp.	(1.5)	.....
☐ Fornitura	(1.5)	.....

Stop in fossa	(1,5)	.....
Cavo puntone In fossa	(6)	.....
Sirena allarme [inserire in disposizione vano]	(1,5)	.....
Cavo di terra per guide	(10)	.....
Canalina 60 x 40	(H vano)	.....
Fascette e tasselli per fissaggio canalina		
Cavo display se in bottoniera separata ☐ Accesso A	(3.5)	.....
☐ Accesso B	(5.5)	.....
☐ Accesso C	(5.5)	.....

Opzioni generiche

☐ Stop tetto cabina	(1.5)	.....
☐ Cavo apertura bottoniera di cabina	(1.5)	.....
☐ Cavo botola tetto cabina	(2)	.....
☐ Cavo tenditore limitatore di velocità	(6)	.....
☐ Cavo contatto allentamento funi	(3)	.....

Segnalazione campana (L.13)
- ☐ Al piano principale
- ☐ A tutti i piani
- ☐ Nel display

Fotocellule
- ☐ Predisposizione
- ☐ Fornitura fotocellula
- ☐ Fornitura barriera

Combinatore modello
- ☐ KM0+ con SIM
- ☐ KM0+ senza SIM
- ☐ Esseti
- ☐ Predisposizione .....

☐ Modulo GSM con cavo da 5 m

☐ Prolunga GSM (20) .....

Periferiche combinatore
- ☐ Locale macchina (1.5) .....
- ☐ Interno cabina (3.5) .....
- ☐ Solo predisposizione

Citofonia (L.13)
- ☐ Locale macchina (1.5) .....
- ☐ Cabina (3.5) .....

☐ Gong tetto cabina (1) .....

Le misure standard sono calcolate considerando che:
- La canalina di vano viene posizionata dal lato della battuta delle porte in prossimità delle stesse solo dal lato dell'accesso A.
- L'accesso A è considerato quello con l'ingresso del piano più basso e nel caso di doppio piano basso, quello con più servizi.
- Le bottoniere di piano vengono posizionate dal lato della battuta delle porte in prossimità delle stesse.
- Tutte le derivazioni di vano sono prelevate all'altezza della bottoniera del relativo piano.
- I cavi piatti vengono posizionati in prossimità della canalina.
- Nel caso in cui all'ordine venissero allegati disegni di vano in cui non sono previste le: posizione Q.M., percorso dei cavi dal Q.M. al vano e relative misure, posizioni della canalina, attacco dei cavi piatti o posizione delle bottoniere, le misure saranno considerate tenendo conto dei punti precedenti.
